

Côte-d'Or

Contournement de Mirebeau-sur-Bèze



cotedor.fr



Point d'avancement des travaux

Les travaux de contournement de Mirebeau-sur-Bèze, sur la RD 70 et la RD 959, se sont poursuivis cette année. La future route, de 4,7 km, permettra de résoudre d'importants problèmes d'encombrement, de sécurité et de nuisances. Les convois exceptionnels sur l'axe Dijon-Gray réduiront leur parcours de 20 km et les habitants de la vallée de la Vingeanne pourront rejoindre plus rapidement Dijon en évitant Mirebeau-sur-Bèze.


En 2013, les travaux ont débuté avec l'aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD 70 au Sud de Mirebeau. En 2014, ce sont un carrefour giratoire sur la RD 959 au Nord en direction de Bèze et deux ponts, l'un au lieu-dit « Bas de Dame Jeanne », l'autre au lieu-dit « Sous Brasey », qui ont vu le jour. Un an plus tard, des travaux de remblai ont été réalisés en vue de la construction du pont de la Bèze et des travaux de terrassement de la section courante de la déviation Sud, entre le carrefour giratoire de la RD 70 Sud côté Dijon et la Bèze. En 2016, les travaux se sont poursuivis avec l'aménagement d'un carrefour giratoire avec la RD 959 au Sud de Mirebeau-sur-Bèze et le terrassement de la section Sud de la déviation, entre le giratoire de la RD 959 et la RD 25C.

En 2017, la 1^{re} phase des travaux de construction du futur pont de la « Bèze » a été réalisée avec le terrassement de la section routière Ouest, entre le giratoire Sud de la RD 70 et le pont situé au lieu-dit « Sous Brasey », et l'aménagement d'un giratoire à l'intersection avec la RD 25A.

Les travaux 2018 se sont concentrés sur les terrassements entre le giratoire Sud de la RD 70 et le giratoire Nord de la RD 959 ainsi que le raccordement définitif de la RD 112 sur ce dernier giratoire mis en service en décembre 2018. Une zone humide près de la Bèze a été traitée, avec la création d'une frayère à poissons. Le chantier se poursuivra avec la construction du tronçon principal du pont de franchissement de « la Bèze ».

Ce grand projet structurant pour l'ensemble du territoire est financé à hauteur de 24,45 M€ par le Département de la Côte-d'Or. Il constitue un enjeu majeur pour l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble des habitants du secteur de Mirebeau-sur-Bèze, des entreprises travaillant sur le territoire ainsi que des usagers de la route se rendant en Haute-Saône.

Contournement de Mirebeau-sur-Bèze pour 24,45 M€

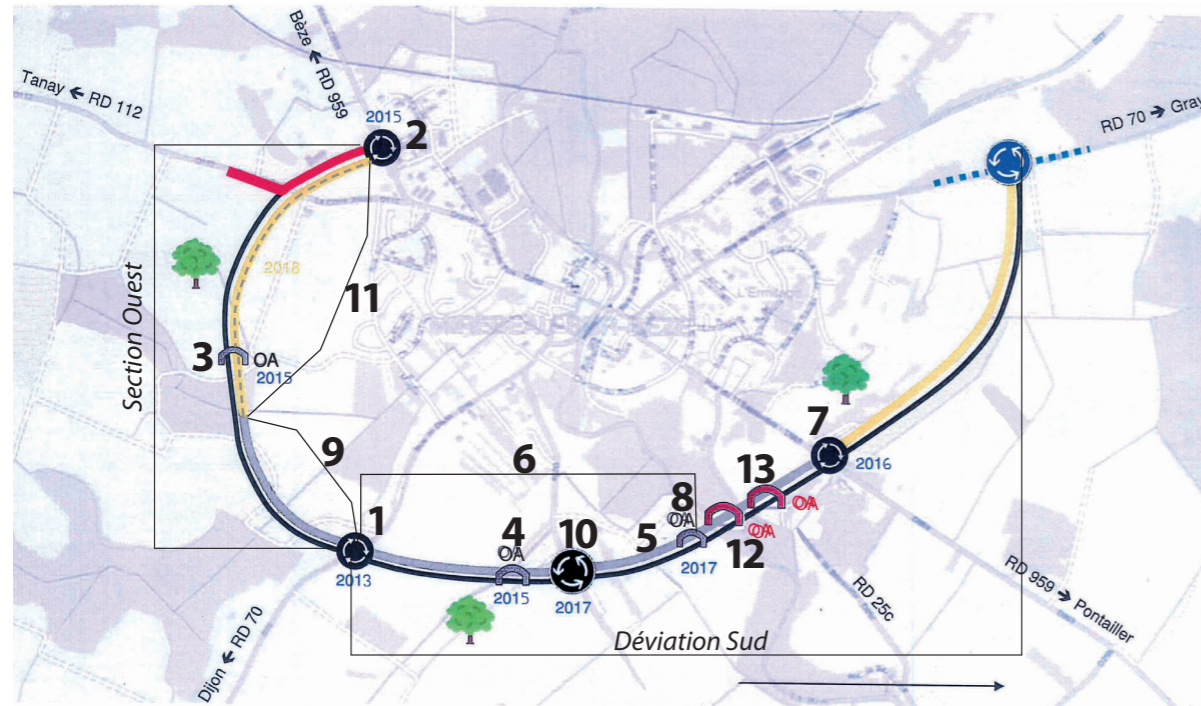

..... en 2018

Travaux routiers pour 1,6 M€

- 11 Terrassement de la section Ouest**
Réalisation des couches d'assises
- Raccordement définitif de la RD 112 en direction de la RD 959**
Ouverture à la circulation en décembre 2018
- Travaux de compensation du contournement de Mirebeau-sur-Bèze**
Traitement d'une zone humide en bordure de la Bèze, création d'une frayère à brochets et conservation d'un bosquet d'Aulnes existants
- Travaux réalisés par le groupement d'entreprises ROGER MARTIN / COLAS SNEL et les entreprises DESERTOT, COLAS EST.
- La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont assurées par le Département de la Côte-d'Or.



Aménagement d'une zone humide - Octobre 2018



Terrassement de la section Ouest - Novembre 2018

en 2017

- 8 Pont de décharge des crues de « la Bèze » pour 878 000 €**
L'ouvrage en béton permet l'écoulement des eaux de la « Bèze » lors des crues. Les travaux ont commencé par les fondations permettant l'installation ultérieure des appuis du pont. Des remblais ont préparé la pose du tablier. Le pont a été habillé de garde-corps. L'entreprise SNCTP a réalisé les travaux.
- 9 Terrassement RD 70 pour près d'1 M€**
Terrassement de la section routière Ouest entre le giratoire Sud RD 70 et l'ouvrage d'art situé au lieu-dit « sous Brasey » réalisé en 2014 et 2015. Le groupement d'entreprises ROGER MARTIN / COLAS SNEL a réalisé les travaux.
- 10 Aménagement d'un giratoire pour 608 000 €**
Construction d'un giratoire à l'intersection avec la RD 25A
L'entreprise BONGARZONE (lot 1) et le groupement d'entreprises ROGER MARTIN / COLAS / SNEL (lot 2) ont réalisé les travaux.
Ouverture à la circulation en novembre 2017



Construction du pont - Octobre 2017



Terrassement Sud RD 70 - Novembre 2017



Giratoire RD 25A - Novembre 2017

..... en projet

- 11 Achèvement de la section Ouest de la déviation entre le carrefour RD 112 et RD 70**
- 12 Construction du pont franchissant la « Bèze »**

Objectif : mise en service de la section Ouest en 2019

..... l'info en plus

- **Travaux d'accompagnement de la déviation**
- **Chemins agricoles et facilités d'accès pour les riverains**
Le long de l'aménagement, des chemins de dessertes agricoles sont prévus pour rendre accessibles les différentes parcelles.
- **Aménagement paysager**
Des plantations de végétaux (arbustes, vivaces) sont prévues pour contribuer à l'intégration durable de la voie nouvelle dans le paysage.

Travaux réalisés depuis 2013



Création d'un carrefour giratoire Sud RD 70 : 725 000 €

Création d'un carrefour giratoire se situant à proximité de la zone commerciale sur la RD 70 près de l'entrée Sud Ouest de Mirebeau-sur-Bèze

Travaux réalisés par :

L'entreprise COLAS EST Agence SNEL

■ Début des travaux : août 2013

■ Fin des travaux : octobre 2013

■ Mis en service en janvier 2014



Aménagement d'un carrefour giratoire Nord RD 959 : 385 000 €

Construction d'un giratoire sur la RD 959 au Nord en direction de Bèze qui dessert la zone d'activités de Bocanon

Travaux réalisés par :

Les entreprises PENNEQUIN (terrassements) et EIFFAGE (enrobés)

■ Début des travaux : fin de l'été 2014

■ Fin des travaux : mai 2015

■ Mis en service en janvier 2016



Construction d'un ouvrage d'art : 336 000 €

Au lieu-dit « Sous Brasey », mise en oeuvre d'un passage destiné aux piétons et aux deux roues sous la future voie

Travaux réalisés par :

Le groupement d'entreprises SNCTP - ROGER MARTIN

■ Début des travaux : août 2014

■ Fin des travaux : février 2015



Construction d'un ouvrage d'art : 405 000 €

Au lieu-dit « Bas de Dame Jeanne » sur la déviation Sud, construction d'un ouvrage hydraulique

Travaux réalisés par :

Le groupement d'entreprises SNCTP - ROGER MARTIN

■ Début des travaux : août 2014

■ Fin des travaux : février 2015



Travaux de remblai : 336 000 €

Réalisation du remblai en vue de la création du futur pont

Travaux réalisés par :

L'entreprise ROGER MARTIN

■ Début des travaux : mai 2015

■ Fin des travaux : novembre 2015



Terrassement de la section courante déviation Sud : 745 000 €

Réalisation du terrassement de la section courante de la déviation Sud entre le carrefour giratoire de la RD 70 Sud côté Dijon et la Bèze

Travaux réalisés par :

Le groupement d'entreprises ROGER MARTIN - SNEL

■ Début des travaux : octobre 2015

■ Fin des travaux : début 2016



Giratoire RD 959 Sud et terrassement : 970 000 €

Construction d'un carrefour giratoire de la RD 959 Sud et terrassement entre la RD 25C et la RD 959

Travaux réalisés par :

L'entreprise PENNEQUIN et le groupement d'entreprises ROGER MARTIN - SNEL

■ Début des travaux : juin 2015

■ Fin des travaux : fin novembre 2016

■ Mis en service fin 2016
